

Kundenurkunde und Anlagenregistrierung

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben soeben Ihr eigenes Energiespeichersystem in Betrieb genommen! Damit können Sie bis zu 80% Ihres Jahresstrombedarfs selbst abdecken.

Um Ihren Weg in die Selbstversorgung komplett zu machen und einen reibungslosen Betrieb und Service zu ermöglichen, bitten wir Sie, die folgenden vier Punkte gemeinsam mit Ihrem Fachinstallateur durchzugehen und abzuzeichnen!

Übermitteln Sie diese der Deutsche Energieversorgung GmbH per E-Mail, per Fax oder per Brief an:

**Deutsche Energieversorgung GmbH
SENEC.Home G2 Unabhängigkeitserklärung
Am Schenkberg 12 – 04349 Leipzig
E-Mail: unabhaengigkeit@senec-ies.com**

Folgende Punkte sind bei der Übergabe eingehalten worden:

- Die Montagebedingungen im Raum – insbesondere eine ausreichende Belüftung – sind gemäß Installationsanleitung eingehalten. Dies beinhaltet auch folgende Punkte:
 - ordnungsgemäße Verschlauchung für Umwälzung
 - Mindestabstand zu elektronischen Geräten von 30 cm ist gewährt
 - alle Kabel sind fest montiert
 - die Einbauempfehlung ist beachtet
 - Sicherheitsbestimmungen sind eingehalten
- SENE.Home G2 wurde nach folgendem Schema installiert (siehe Kurzanleitung oder Installationsanleitung)
 - Anschlussvariante 1 (1 EnFluRi-Sensor)
 - Anschlussvariante 2 (2 EnFluRi-Sensor)
- Das System wurde störungsfrei in Betrieb genommen und liefert entsprechend seiner Funktionsbeschreibung Strom zu Ihrer Eigennutzung.
- Sie haben von Ihrem Fachinstallateur eine Sicherheitsunterweisung gemäß Installationsanleitung bekommen und diese verstanden.
- Sie wurden darüber informiert, dass Sie sich folgende Produktunterlagen auf www.senec-ies.com herunterladen können:
 - Benutzerhandbuch
 - Garantiebedingungen
 - Unterlagen zur Anmeldung bei Ihrem Energieversorger
- Foto (Draufsicht vom Akku, Verschlauchung und Anschluss der Zellen muss sichtbar sein) wird der Anlagenregistrierung beigelegt

Anlagenregistrierung

Bitte tragen Sie (Installateur) in die unten stehenden Felder die Anschrift des Montageorts, die Seriennummer des Systems (befindet sich an der linken Seite des Schaltschranks auf dem Produktlabel) sowie das Datum der Inbetriebnahme ein und quittieren Sie das mit Ihrem Stempel und Ihrer Unterschrift!

Montageort und Betreiber: PLZ, Ort, Straße, Hausnummer Name, E-Mail-Adresse, Telefon	
Fachbetrieb: PLZ, Ort, Straße, Hausnummer Name, E-Mail-Adresse, Telefon	
Seriennummer SENE.Home:	
Datum der Inbetriebnahme:	

Vorgehen bei der Inbetriebnahme:

1. Hausstrom zuschalten (AC-Strom zuführen)
2. Batterielasttrennschalter einschalten (DC-Strom zuführen)
3. Im Schaltschrank Sicherungen F1 und F2 einschalten

Wichtig!

Akkus zuerst so befüllen, dass der obere Ring des Handfüllsteckstopfens bedeckt ist. Zur richtigen Inbetriebnahme des SENE.Home G2 und der Befüllung der Zellen befolgen Sie bitte die Installationsanleitung.

Bitte beachten:

Der Akku muss zu mindestens 85 % geladen sein, erst dann darf Wasser nachgefüllt werden
(Richtwert: Bei $1,24-1,28 \text{ g/cm}^3$ Säuredichte ist Akku zu mehr als 80 % geladen)!

Datenschutz / Informationen

Mit dem Abschicken des Formulars erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Deutsche Energieversorgung GmbH die abgegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Marktanalyse auf unbestimmte Zeit elektronisch speichert und nutzt. Die personenbezogenen Daten die ich übermittle, dürfen von der Deutsche Energieversorgung GmbH zur Korrespondenz mit mir oder für die Zwecke verwendet werden, für die ich die Daten zur Verfügung stelle.

Sie können meine Adressdaten dazu benutzen, mich gelegentlich über ihre Angebote und Dienstleistungen sowie Neuerungen zu informieren. Ich bin ausdrücklich bis auf Widerruf damit einverstanden, dass die Deutsche Energieversorgung GmbH mich mit weiteren Informationen, entweder postalisch oder auf elektronischem Weg, versorgt. Die Daten dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Die Datenspeicherung hat unter Berücksichtigung der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzes zu erfolgen. Ich bin darüber belehrt worden, dass ich diese Einverständniserklärung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen kann.

Hiermit versichert Ihnen Ihr Fachinstallateur, dass die Sicherheitshinweise in der Installationsanleitung gelesen, verstanden und beim Einbau befolgt wurden!

Datum/Unterschrift Betreiber

Datum/Unterschrift/Stempel Fachinstallateur

Seite 2 von 2

– Wichtiges Dokument! Bitte aufbewahren! Kopie für Betreiber und Fachbetrieb anfertigen! –

VORDRUCK ZUR INSTALLATION UND WARTUNG DER SENEK-HOME G2 AKKU-ZELLEN

Seriennummer des Speichersystems

Standort der Anlage


Name des Kunden

Installation/Wartung am

Akku-Zelle	Säuregehalt (in g/ccm)	destilliertes Wasser nachgefüllt (in ml)	Spannung (in V)
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
16	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
17	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
18	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
19	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
22	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
23	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
24	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Wichtig:

Beachten Sie die richtige Reihenfolge der Verbindung der Zellen!

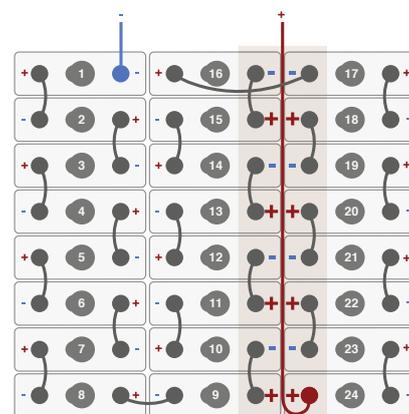

Datum Installation/Wartung

Unterschrift Installateur

Für den Kunden: Lassen Sie jährlich den Blei-Akkumulator von Ihrem Installateur prüfen und heben Sie dieses Protokoll auf.
